Verkehrslandeplatz Coburg

Grobterminplan Bauphase

FICHTNER

Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3
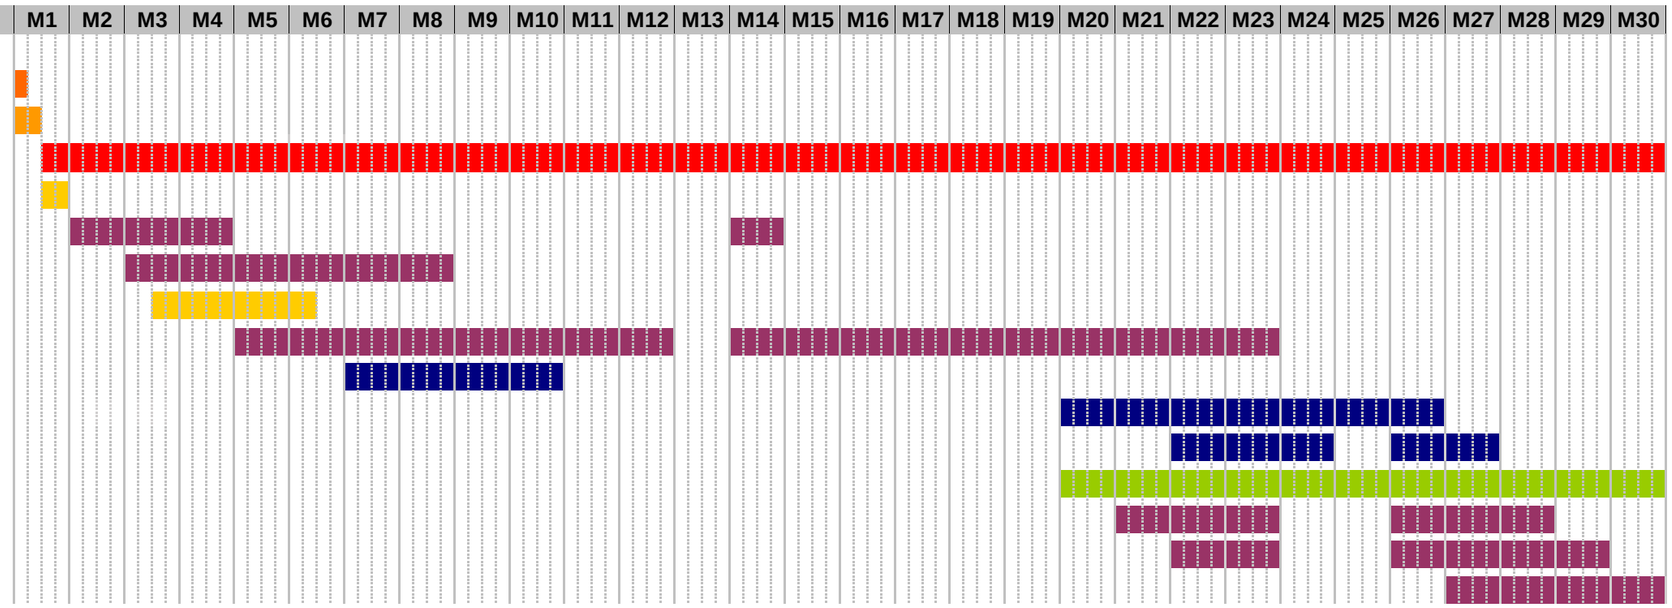
Vorgang	Monat
Auftragserteilung	
Baustelleneinrichtung	0,5
Bauzeit	**29,5**
Zufahrt zur St 2205	0,5
Rodungsarbeiten, Baufeldfreimachung	4
Großflächige Oberbodenarbeiten	6
Verlegung GVS Neida-Herbartsdorf	3
Großräumiger Erdbau	18
Ver-/Entsorgungsanschlüsse	4
Flugbetriebsflächen	7
Landseitige Verkehrsanlagen	6
Hochbau (Tower, Hangars)	11
Geländemodellierung	6
Oberbodenarbeiten	6
Außenanlagen, inkl. Zaun	4
